


※1：計器不良
※2：テータ採取対象外

号機	1u	2u	3u	4u	5u	6u
注水状況	給水ポンプを用いた給水注入中。 流量 117l/min (4/1 16:18) 仮設計器	消火ポンプを用いた給水注入中。 流量 150l/min (3/30 14:00) 仮設計器	消火ポンプを用いた給水注入中。 流量 116l/min (3/29 14:39) 仮設計器	停止中	停止中	停止中
原子炉水位	燃料棒A：-1600mm 燃料棒B：-1600mm (4/2 4:00 現在)	燃料棒A：-1500mm (4/2 4:00 現在)	燃料棒A：-1850mm 燃料棒B：-2250mm (4/2 1:30 現在)	※2	停止域 1799mm (4/2 6:00 現在)	停止域 1534mm (4/2 6:00 現在)
原子炉圧力	0.288MPa g (A) 0.520MPa g (B) (4/2 4:00 現在)	-0.011MPa g (A) -0.014MPa g (B) (4/2 4:00 現在)	0.025MPa g (A) -0.086MPa g (C) (4/2 1:30 現在)	※2	0.007MPa g (4/2 6:00 現在)	0.005MPa g (4/2 6:00 現在)
原子炉水温度	(系統流量がないため採取不可)					
原子炉圧力容器 温度	給水ノズル温度：261.5℃ 圧力容器下部温度：118.0℃ (4/2 4:00 現在)	給水ノズル温度：155.0℃ 圧力容器下部温度 ※1 (4/2 4:00 現在)	給水ノズル温度：90.8℃(調査中) 圧力容器下部温度：119.4℃ (4/2 1:30 現在)	4u:原子炉内に発熱体(燃料)なし 5,6u:原子炉水温度にて監視中		
D/W・S/C圧力	D/W 0.160MPa abs S/C 0.160MPa abs (4/2 4:00 現在)	D/W 0.110MPa abs S/C タウンスクール(調査中) (4/2 4:00 現在)	D/W 0.1055MPa abs S/C 0.1748MPa abs (4/2 1:30 現在)	※2		
CAMS	D/W 4.55X10 ³ Sv/h S/C 1.65X10 ³ Sv/h (4/2 4:00 現在)	D/W 3.61X10 ³ Sv/h S/C 9.81X10 ³ Sv/h (4/2 4:00 現在)	D/W 2.40X10 ³ Sv/h S/C 9.55X10 ³ Sv/h (4/2 1:30 現在)	※2		
D/W 器計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	※2		
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	※2		
使用済燃料プール	※1	72.0℃ (4/2 4:00 現在)	※1	※1	34.1℃ (4/2 6:00 現在)	27.0℃ (4/2 6:00 現在)
FPC 燃料プールの 電源	4500mm (4/2 4:00 現在)	※1	※1	5100mm (4/2 1:30 現在)		
その他情報	外部電源受信中 (P/C2C) 外部電源受信中 (P/C4D) 共用プール： 32℃程度 (4/1 7:30)					
その他情報	外部電源受信中 5u:非稼モード (4/1 22:12~) 6u:SHCモード (4/1 11:39~)					

3号機 原子炉圧力容器温度について、テータ採取を行い、状況推移を継続調査中。
2号機 S/C圧力について、状況推移を継続調査中。
2号機 FPC燃料プールの電源について、状況推移を継続調査中。

圧力換算 ゲージ圧(MPa g) = 絶対圧(MPa abs) - 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)
絶対圧(MPa abs) = ゲージ圧(MPa g) + 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)


福島第一原子力発電所1号機の状況 (4月2日 06:00現在)

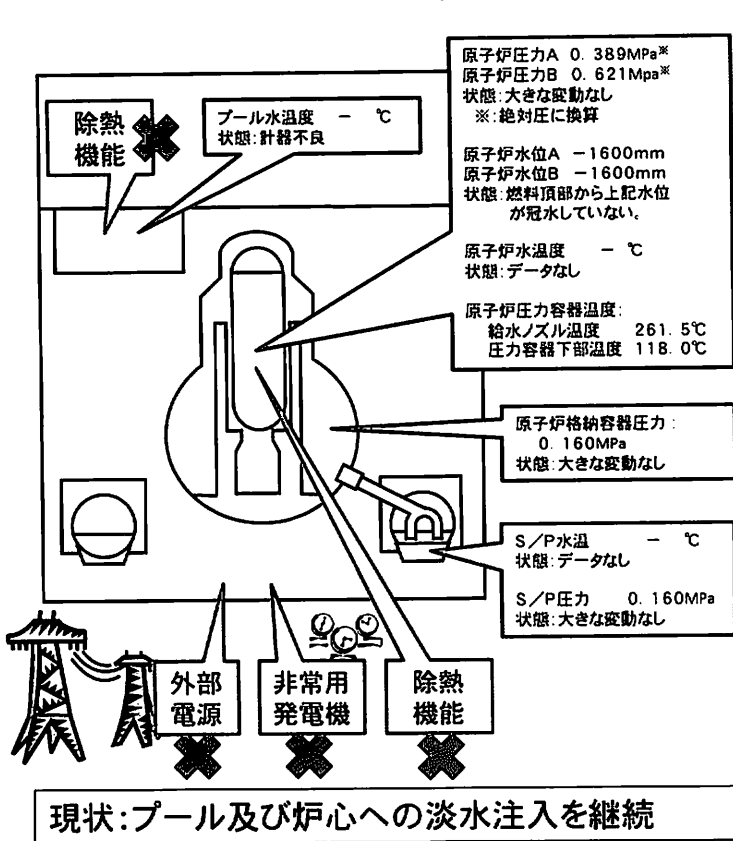

発生後の主要なできごと

- 11日 14:46 運転中、地震により自動停止
- 11日 15:42 10条通報(全交流電源喪失)
- 11日 16:36 15条事象の発生(非常用炉心冷却装置注水不能)
- 12日 01:20 15条事象の発生(格納容器圧力異常上昇)
- 12日 10:17 ベント開始
- 12日 15:36 爆発音
- 12日 20:20 海水及びホウ酸の炉心注入開始
- 23日 02:33 消火系に加え、給水系を使うことにより炉心への注水量を増量(2m³/h → 18m³/h)。9:00に給水系のみに切替(18m³/h → 11m³/h)
- 24日 11:30 中央制御室の照明復帰
- 25日 15:37 淡水の炉心注入開始
- 29日 08:32 仮設電動ポンプでの炉心注水に切替
- 31日 12:00 復水貯蔵タンク(CST)からサブプレッションプール水サージタンク(SPT)へ移送開始
- 31日 13:03 ~16:04 コンクリートポンプ車による放水(淡水)

福島第一原子力発電所2号機の状況 (4月2日 06:00現在)

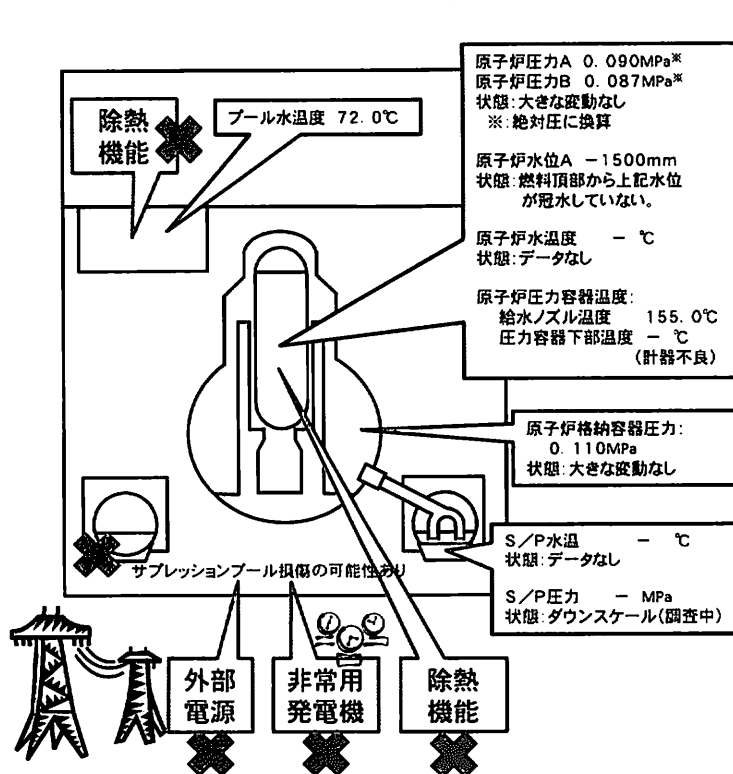


発生後の主要なできごと


- 11日 14:46 運転中、地震により自動停止
- 11日 15:42 10条通報(全交流電源喪失)
- 11日 16:36 15条事象の発生(非常用炉心冷却装置注水不能)
- 13日 11:00 ベント開始
- 14日 13:25 15条事象の発生(原子炉冷却機能喪失)
- 14日 16:34 海水の炉心注入開始
- 14日 22:50 15条事象の発生(格納容器圧力異常上昇)
- 15日 0:02 ベント開始
- 15日 06:10 爆発音発生
- 15日 06:20頃 サプレッションプール(圧力抑制室)損傷の可能性あり
- 20日 15:05~17:20 使用済燃料プール冷却系(FPC)から使用済燃料プール(SFP)に約40tの海水を注水
- 20日 15:46 パワーセンター受電
- 21日 18:22 白煙が発生
- 22日 7:11にほとんど見えない程度に減少
- 22日 16:07 SFPに約18tの海水を注水
- 25日 10:30~12:19 FPCからSFPに海水を注水
- 26日 10:10 淡水の炉心注入開始
- 26日 16:46 中央制御室の照明復帰
- 27日 18:31 仮設電動ポンプでの炉心注水に切替
- 29日 16:30~18:25 仮設電動ポンプに切替、SFPに淡水注入
- 29日 16:45~1日 11:50 復水貯蔵タンク(CST)からサブプレッションプール水サージタンク(SPT)へ移送
- 30日 9:25~23:50 SFPへ注水していたところ、仮設電動ポンプの不調を確認(9:45)。消防ポンプに切替えて注入するが、ホース破損が確認(12:47,13:10)されたため、注入中断。19:05に淡水注水を再開。
- 1日 14:56~17:05 SFPからSFPへ仮設電動ポンプにより淡水注入

現状: プール及び炉心への淡水注入を継続


福島第一原子力発電所3号機の状況 (4月2日 06:00現在)

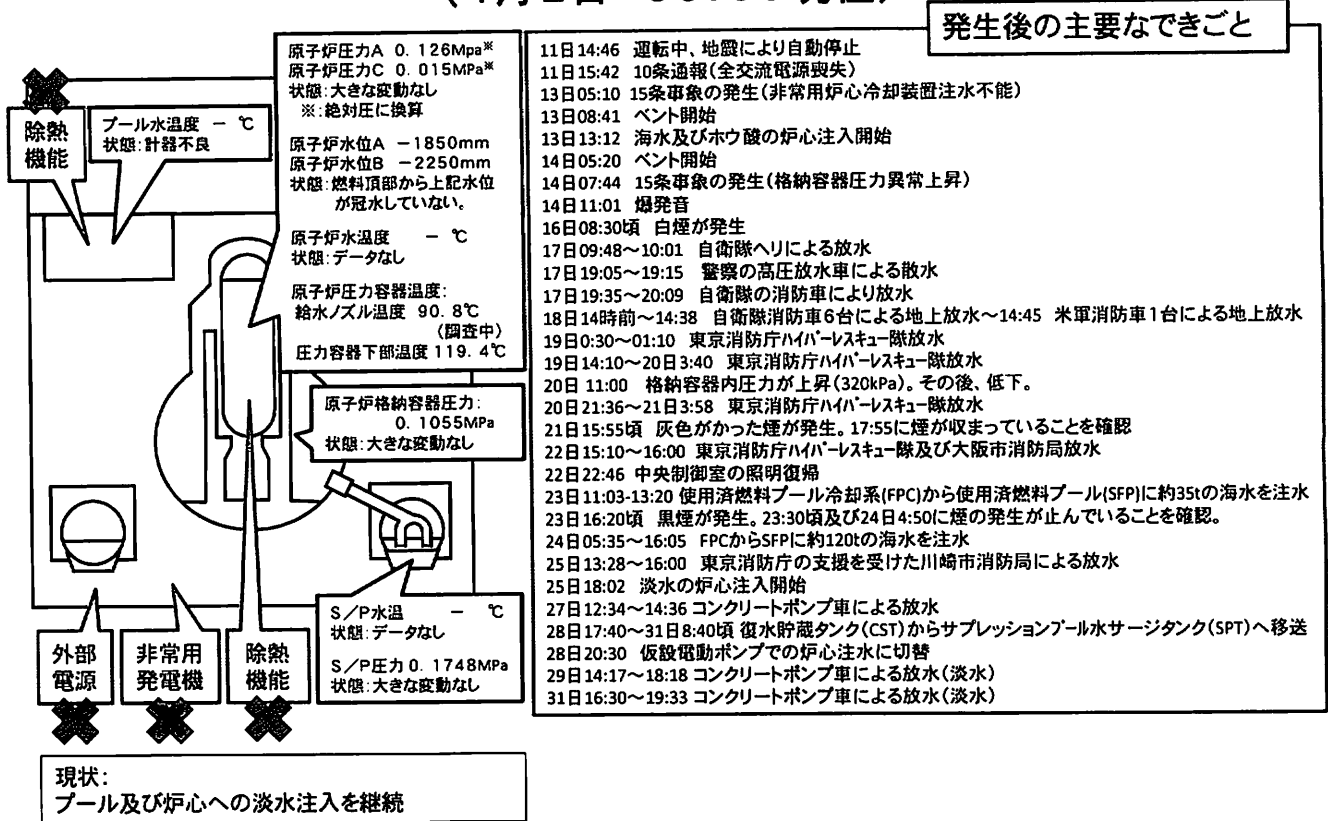

福島第一原子力発電所4号機の状況 (4月2日 06:00現在)

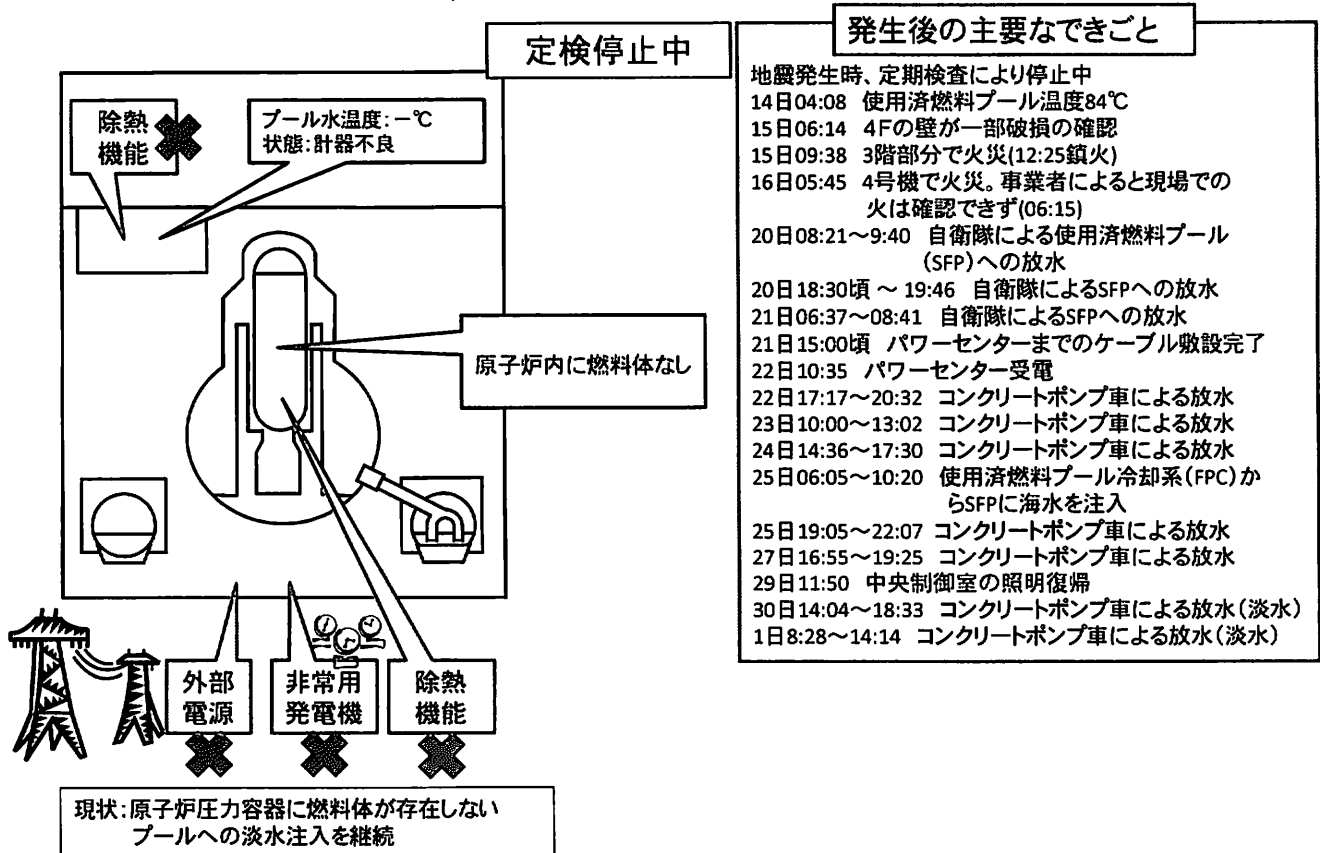

福島第一原子力発電所5号機の状況 (4月2日 06:00現在)

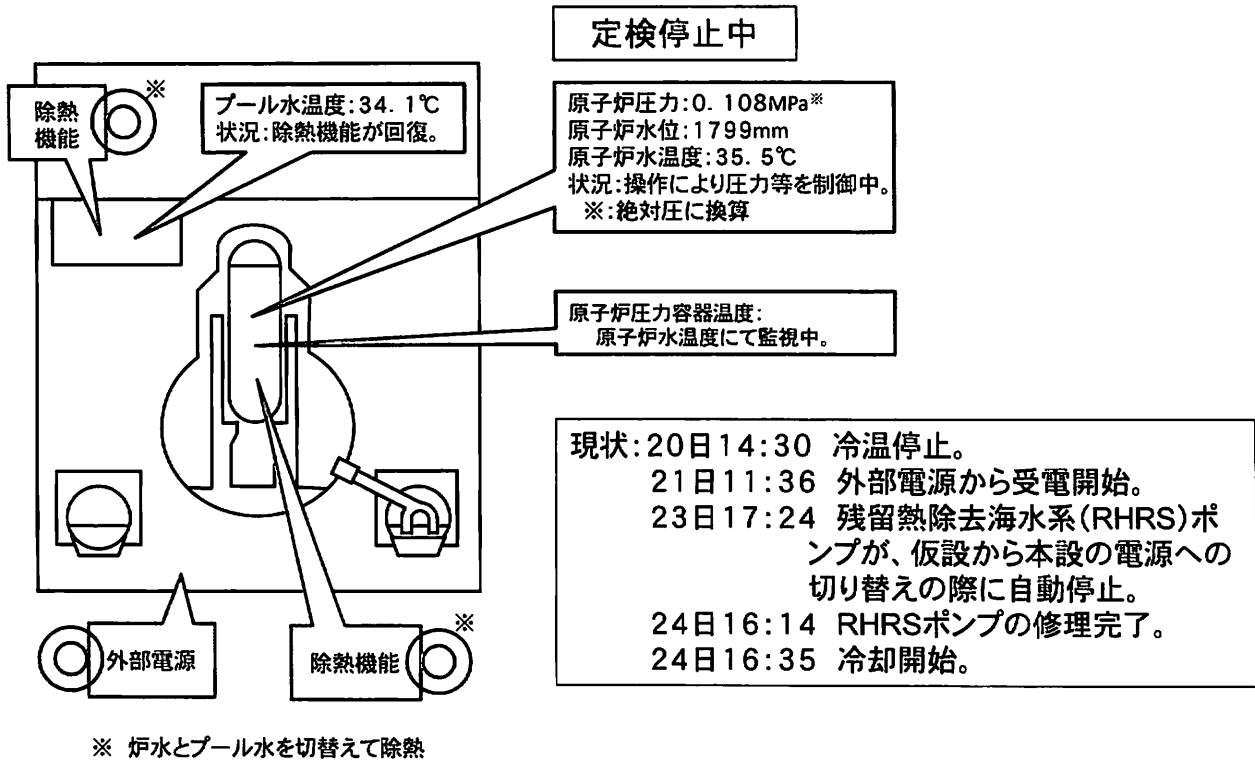

福島第一原子力発電所6号機の状況 (4月2日 06:00現在)

